

طرح شهید پناهی

جمع آوری مدارس کانکسی ۱۰+ استان فارس



سازمان نوسازی و تجهیز مدارس


- ❖ فاز اول: لیست نهایی تایید شده مدارس کانکسی مشمول طرح شهید پناهی سطح استان
- ❖ فاز دوم: مشخص کردن ضوابط فنی مربوط به طرح (با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و محیطی هر منطقه)
- ❖ فاز سوم: منابع مالی طرح صرفاً جهت ساختمان آموزشی
- ❖ فاز چهارم: اجرا و نظارت
- ❖ فاز پنجم: اطلاع رسانی و پیوست رسانه ای طرح
- ❖ آمار مدارس قرارداد بسته شده
- ❖ آمار مدارس دارای خیر
- ❖ آمار پروژه های نیمه تمام با مشارکت بنیاد برکت
- ❖ آمار مدارس از اعتبارات سازمان نوسازی

فاز اول:

شناسایی مدارس کانکسی و
سنگی و مشخص کردن تعداد در
استان فارس

اطلاعات لیست نهایی طرح شهید پناهی

اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)		جمعیت	زیربنا	تعداد کانکس	تعداد مدارس	عنوان	
تعهد خیری	تعهد دولتی						
۳۷۸,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۹۳۹	۴۱۹۷.۵	۷۲	۴۱	لیست پروژه های دارای تعهد برکت (نامه شماره ۲۷۶۸)	لیست کلی پروژه ها
۱,۱۴۷,۰۰۰	۰	۲۰۱۵	۸۰۹۹	۱۲۲	۶۰	سایر	
۱,۵۲۵,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۲۹۵۴	۱۲۲۹۶.۵	۱۹۴	۱۰۱	جمع کل	

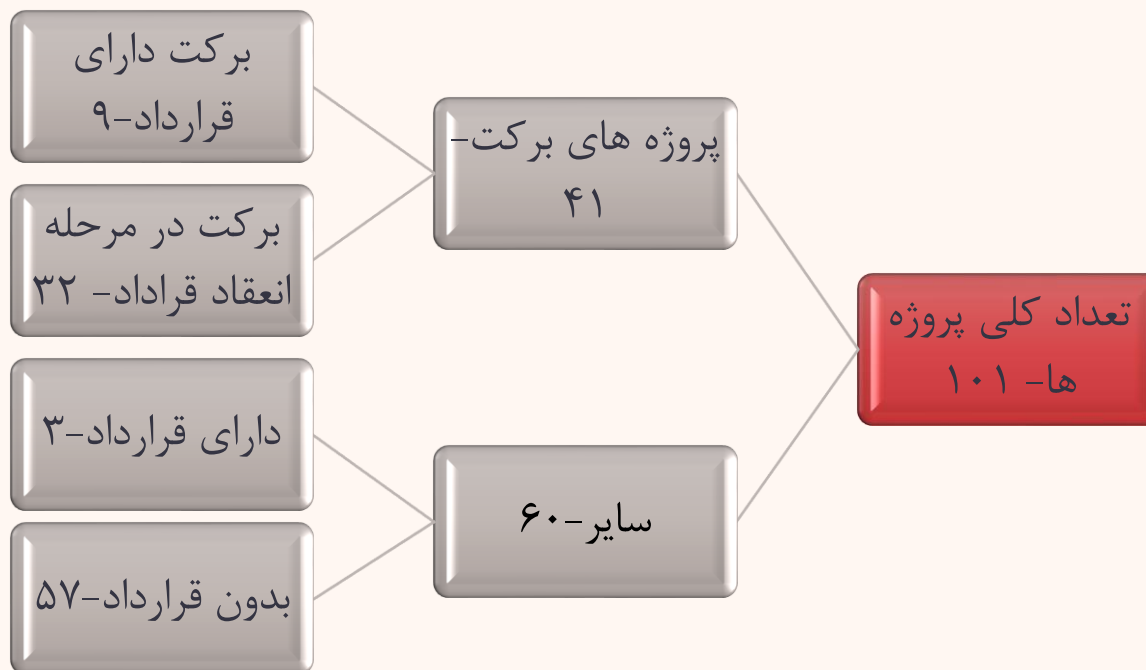

۴۱ مدرسه مصوب بنیاد برکت



بنیاد برکت
بنیاد خیرین
بنیاد خیرین
بنیاد خیرین

باسمه تعالی



شماره: ۲۷۶۸
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
پوست: ندارد



شماره: ۲۷۶۸
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
پوست: ندارد

برادر ارجمند جناب آقای دکتر رخشانی مهر

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

سلام علیکم

احتراماً، عطف به تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ فی‌مابین ریاست محترم ستاد و وزیر محترم آموزش و پرورش به شماره ۱۸۹۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ مبنی بر "احداث ۱۰۰۰ باب مدرسه ۱ تا ۲ کلاس جایگزین مدارس کانکسی و تکمیل ۵۰۰ باب مدرسه نیمه تمام دولتی روستایی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، ساخت ۴۴ باب مدرسه با مجموع ۷۴ کلاس درس جایگزین مدارس کانکسی به شرح جدول پیوست و تأمین اعتبار تکمیل یک باب مدرسه ۶ کلاس نیمه تمام به شرح جدول ذیل جهت ابلاغ به استان‌های ذیربط برای اجرا، تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تأمین اعتبار سهم سازمان نسبت به ساخت و تکمیل مدارس مذکور اقدامات مقتضی انجام پذیرد.

استان	شهرستان	نام پروژه و محل اجرا	تعداد بنیاد (میلیارد ریال)
سیستان و بلوچستان	دلگان	تکمیل مدرسه ۶ کلاس روستای ده پایه زیارت گنبد	۱۲/۵

محمد ترکانه

لیست ۴۴ باب مدرسه جایگزین کانکسی

ردیف	استان	شهرستان	نام پروژه و محل اجرا	تعداد کلاس
۱	سمنان	شاهرود	مدرسه ۱ کلاس روستای تجور	۱
۲		شاهرود	مدرسه ۱ کلاس روستای حجاج	۱
۳		استهبان	مدرسه ۳ کلاس روستای چاه کردخانی	۳
۴		کازرون	مدرسه ۳ کلاس روستای سرمشهد	۳
۵	قارس	کازرون	مدرسه ۳ کلاس روستای علی‌آباد	۳
۶		چهرم	مدرسه ۱ کلاس روستای سیمکان	۱
۷		چهرم	مدرسه ۱ کلاس روستای موسویه	۱
۸		خرامه	مدرسه ۲ کلاس روستای کریال	۲
۹		خنج	مدرسه ۱ کلاس روستای سده	۱
۱۰		خنج	مدرسه ۱ کلاس روستای سیق‌آباد	۱
۱۱		خنج	مدرسه ۲ کلاس روستای چم کوکو	۲
۱۲		داراب	مدرسه ۱ کلاس روستای بیزان	۱
۱۳		داراب	مدرسه ۳ کلاس روستای درنگانه	۳
۱۴		داراب	مدرسه ۱ کلاس روستای قدیمی	۱
۱۵		زرین	مدرسه ۱ کلاس روستای دشت خاک	۱
۱۶		سروستان	مدرسه ۱ کلاس روستای مومن‌آباد	۱
۱۷		شیواز	مدرسه ۲ کلاس روستای سیخ توروز آباد	۲
۱۸		شیواز	مدرسه ۲ کلاس روستای پتک	۲
۱۹		قراشپند	مدرسه ۲ کلاس روستای قره‌اش‌آباد	۲
۲۰		قراشپند	مدرسه ۱ کلاس روستای اویز	۱
۲۱		قراشپند	مدرسه ۱ کلاس روستای گنبد	۱
۲۲		قراشپند	مدرسه ۱ کلاس روستای کورکی	۱
۲۳		قراشپند	مدرسه ۲ کلاس روستای پهنایه‌ن	۲
۲۴		قسا	مدرسه ۳ کلاس شهرک عشایری چاپهن	۳

ردیف	استان	شهرستان	نام پروژه و محل اجرا	تعداد کلاس
۲۵	همدان	فیروزآباد	مدرسه ۲ کلاس روستای سلامت‌آباد	۲
۲۶		فیروزآباد	مدرسه ۱ کلاس روستای مه بنیاد	۱
۲۷		قبر	مدرسه ۱ کلاس روستای هنگام	۱
۲۸		قبر	مدرسه ۲ کلاس روستای افزر	۲
۲۹		قبر	مدرسه ۱ کلاس روستای ملاقله	۱
۳۰		قبر	مدرسه ۳ کلاس روستای باغیو	۳
۳۱		قبر	مدرسه ۱ کلاس روستای توآباد	۱
۳۲		کازرون	مدرسه ۳ کلاس روستای تل سامان	۳
۳۳		کازرون	مدرسه ۲ کلاس روستای سرمشهد	۲
۳۴		کازرون	مدرسه ۲ کلاس روستای جره	۲
۳۵		کازرون	مدرسه ۱ کلاس روستای دادین	۱
۳۶		کازرون	مدرسه ۱ کلاس روستای شور عبدال علیخانی	۱
۳۷		کازرون	مدرسه ۱ کلاس روستای حسین‌آباد	۱
۳۸		کازرون	مدرسه ۱ کلاس روستای حسین‌آباد دیلمی	۱
۳۹		لارستان	مدرسه ۳ کلاس روستای چغدویه	۳
۴۰		لارستان	مدرسه ۲ کلاس روستای مسیح‌آباد	۲
۴۱		لارستان	مدرسه ۲ کلاس روستای منصورآباد	۲
۴۲		مرودشت	مدرسه ۲ کلاس روستای کرهای	۲
۴۳		مرودشت	مدرسه ۲ کلاس شهرک عشایری ابن‌سینا	۲
۴۴		تهران	مدرسه ۱ کلاس روستای قهرمند	۱
۷۴	جمع			

تلفن: ۰۱۵-۸۸۵۲۲۲۰۰ • شماره: ۸۸۵۲۲۲۱۶

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قنبر (بخارست)، خیابان هشتم، شماره ۶ • کدپستی: ۱۵۱۴۷۱۶۷۱۱
www.barakatfoundation.com


تلفن: ۰۱۵-۸۸۵۲۲۲۰۰ • شماره: ۸۸۵۲۲۲۱۶

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قنبر (بخارست)، خیابان هشتم، شماره ۶ • کدپستی: ۱۵۱۴۷۱۶۷۱۱
www.barakatfoundation.com

اطلاعات لیست نهایی طرح شهید پناهی

عنوان	تعداد مدارس	تعداد کانس
پروژه های یک کلاسه	۵۲	۵۲
پروژه های دو کلاسه	۲۹	۵۸
پروژه های سه کلاسه	۹	۲۷
پروژه های چهار کلاسه	۶	۲۴
پروژه های پنج کلاسه به بالا	۵	۳۲

تعداد مدارس

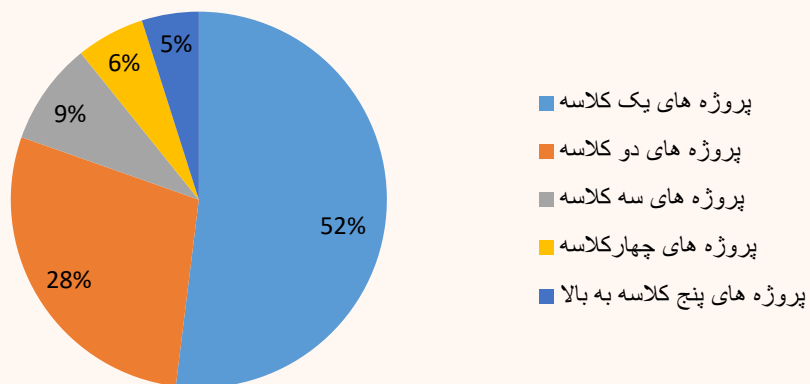

لیست نهایی تایید شده مدارس کانکسی مشمول طرح شهید پناهی سطح استان

ردیف	استان	نام پروژه	شهرستان محل اجرا	تعداد کلاس	زیربنا	تعداد دانش آموز	وضعیت پروژه (در دست اجرا / شروع نشده)	محل تأمین اعتبار پروژه «برکت / سایر (با ذکر نام)»	اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)
۱	فارس	تلاش - تیره کروش شش بلوکی	فرشبند	۲	۱۲۰	۳۱	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۲	فارس	شهیداندرزگو	داراب	۴	۲۲۰	۶۲	شروع نشده	40 درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۳۳,۰۰۰
۳	فارس	آیت اله نساییه	داراب - شهرک عطابخش	۵	۴۱۴	۹۵	شروع نشده	فاقد قرارداد	۶۲,۱۰۰
۴	فارس	آیت اله غفاری اتحاد هنگام	فیروزکازین	۶	۴۵۸	۹۰	شروع نشده	فاقد قرارداد	۶۸,۷۰۰
۵	فارس	مدرسه 2 کلاسه روستای چم کرکر	خنج	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	40 درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۶	فارس	مدرسه شهید قلی آقازبایی روستای شیر دانی	خنج	۲	۱۲۰	۲۷	شروع نشده	40 درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۷	فارس	انصار الحسین کلاه سیاه	خنج	۱	۸۳	۱۶	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۲,۴۵۰
۸	فارس	فردوسی	لار جویم	۱	۸۳	۱۸	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۲,۴۵۰
۹	فارس	مدرسه 3 کلاسه شهرک عشایری چاپین	فسا	۳	۱۵۴.۵	۳۰	شروع نشده	40 درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۲۳,۱۷۵
۱۰	فارس	بنت الهدی	فیروزکازین	۱	۶۴	۱۵	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۱۱	فارس	مدرسه 3 کلاسه روستای چاه کردانی	استهبان	۳	۱۵۴.۵	۳۰	شروع نشده	40 درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۲۳,۱۷۵
۱۲	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای سیمکان	چهرم	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	40 درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۱۳	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای موسویه	چهرم	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	40 درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۱۴	فارس	مدرسه 2 کلاسه روستای کربل	خرامه	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	40 درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۱۵	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای سده	خنج	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	40 درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۱۶	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای سیف آباد	خنج	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	40 درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۱۷	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای بیزان	داراب	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	40 درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۱۸	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای دشت خاک	زرین دشت	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	40 درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۱۹	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای مومن آباد	سروستان	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	40 درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۲۰	فارس	مدرسه 2 کلاسه روستای بکک	شیراز	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	40 درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰

لیست نهایی تایید شده مدارس کانکسی مشمول طرح شهید پناهی سطح استان

ردیف	استان	نام پروژه	شهرستان محل اجرا	تعداد کلاس	زیربنا	تعداد دانش آموز	وضعیت پروژه (در دست اجرا / شروع نشده)	محل تأمین اعتبار پروژه «برکت / سایر (با ذکر نام)»	اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)
۲۱	فارس	مدرسه ۲ کلاسه روستای سیاخ نوروز آباد	شیراز	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۲۲	فارس	مدرسه ۱ کلاسه روستای کورکی ۲	فراشبند	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۲۳	فارس	مدرسه ۱ کلاسه روستای گنبد	فراشبند	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۲۴	فارس	مدرسه ۱ کلاسه روستای آویز	فراشبند	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۲۵	فارس	مدرسه ۲ کلاسه روستای پهنایپن	فراشبند	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۲۶	فارس	مدرسه ۲ کلاسه روستای قرداش آباد	فراشبند	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۲۷	فارس	مدرسه ۱ کلاسه روستای مه بنیاد	فیروزآباد	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۲۸	فارس	مدرسه ۲ کلاسه روستای سلامت آباد	فیروزآباد	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۲۹	فارس	مدرسه ۱ کلاسه روستای ملاقله	قیر	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۳۰	فارس	مدرسه ۱ کلاسه روستای نو آباد	قیر	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۳۱	فارس	مدرسه ۱ کلاسه روستای هنگام	قیر	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۳۲	فارس	مدرسه ۳ کلاسه روستای باغ نو	قیر	۳	۱۵۴.۵	۳۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۲۳,۱۷۵
۳۳	فارس	مدرسه ۱ کلاسه روستای حسین آباد	کازرون	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۳۴	فارس	مدرسه ۱ کلاسه روستای حسین آباد دیلمی	کازرون	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۳۵	فارس	مدرسه ۱ کلاسه روستای دادین	کازرون	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۳۶	فارس	مدرسه ۱ کلاسه روستای شور عبدل علیخانی	کازرون	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۳۷	فارس	مدرسه ۲ کلاسه روستای جره	کازرون	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۳۸	فارس	مدرسه ۲ کلاسه روستای سرمشهد	کازرون	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۳۹	فارس	مدرسه ۳ کلاسه روستای تل سامان	کازرون	۳	۱۵۴.۵	۳۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۲۳,۱۷۵
۴۰	فارس	مدرسه ۳ کلاسه روستای سرمشهد	کازرون	۳	۱۵۴.۵	۳۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۲۳,۱۷۵
۴۱	فارس	مدرسه ۳ کلاسه روستای علی آباد	کازرون	۳	۱۵۴.۵	۳۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۲۳,۱۷۵

لیست نهایی تایید شده مدارس کانکسی مشمول طرح شهید پناهی سطح استان

ردیف	استان	نام پروژه	شهرستان محل اجرا	تعداد کلاس	زیربنا	تعداد دانش آموز	وضعیت پروژه (در دست اجرا / شروع نشده)	محل تامین اعتبار پروژه «برکت / سایر (با ذکر نام)»
۴۲	فارس	مدرسه ۲ کلاسه روستای مسیح آباد	لارستان	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد
۴۳	فارس	مدرسه ۲ کلاسه روستای منصور آباد	لارستان	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد
۴۴	فارس	مدرسه ۳ کلاسه روستای چغدویه	لارستان	۳	۱۵۴.۵	۳۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد
۴۵	فارس	مدرسه ۲ کلاسه روستای کره ای	مرودشت	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد
۴۶	فارس	مدرسه ۲ کلاسه شهرک عشایری ابن سینا	مرودشت	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد
۴۷	فارس	پیوند سادات (بیخ و بنگل داراب)	داراب	۹	669	۲۱۶	در دست اجرا	در مرحله انعقاد قرارداد از محل ابلاغ جمع مدارس کانکسی
۴۸	فارس	خندق	ارسنجان	۲	۱۲۰	۲۴	شروع نشده	فاقد قرارداد
۴۹	فارس	رمضان	ارسنجان	۱	۶۴	۱۷	شروع نشده	فاقد قرارداد
۵۰	فارس	قوامین لبردانی	ارسنجان	۱	۶۴	۱۳	شروع نشده	فاقد قرارداد
۵۱	فارس	شهید جواد احمد آبادی	چهرم	۱	۶۴	۱۲	شروع نشده	فاقد قرارداد
۵۲	فارس	فرهنگ	چهرم	۱	۶۴	۱۵	شروع نشده	فاقد قرارداد
۵۳	فارس	میرزااکوچک خان	خنج	۱	۶۴	۱۴	شروع نشده	فاقد قرارداد
۵۴	فارس	امام حسن مجتبی	داراب	۶	563	۳۵۲	شروع نشده	فاقد قرارداد
۵۵	فارس	قاموس	داراب	۱	۶۴	۱۱	شروع نشده	فاقد قرارداد
۵۶	فارس	دهه فجر دو قزو	دشتستان	۱	۶۴	۱۳	شروع نشده	فاقد قرارداد
۵۷	فارس	ذخایرانقلاب	دشتستان	۲	۱۲۰	۲۱	شروع نشده	فاقد قرارداد
۵۸	فارس	ش چمران توابع	دشتستان	۱	۸۳	۱۷	شروع نشده	فاقد قرارداد
۵۹	فارس	ش فلاحی توابع	دشتستان	۲	۱۲۰	۲۶	شروع نشده	فاقد قرارداد
۶۰	فارس	شباهنک	دشتستان	۲	۱۲۰	۲۳	شروع نشده	فاقد قرارداد
۶۱	فارس	شهید شاهین نادری	دشتستان	۱	۶۴	۱۴	شروع نشده	فاقد قرارداد
۶۲	فارس	شهید علی قاندي	دشتستان	۲	۱۲۰	۱۹	شروع نشده	فاقد قرارداد

لیست نهایی تایید شده مدارس کانکسی مشمول طرح شهید پناهی سطح استان

ردیف	استان	نام پروژه	شهرستان محل اجرا	تعداد کلاس	زیربنا	تعداد دانش آموز	وضعیت پروژه (در دست اجرا / شروع نشده)	محل تأمین اعتبار پروژه «برکت / سایر (با ذکر نام)»	ردیف
۶۳	فارس	شهید محمد باقر صدر	دشتستان	۲	۱۲۰	۲۱	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۶۴	فارس	شوریده شیرازی	دشتستان	۱	۶۴	۱۱	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۶۵	فارس	مقداددوقزلو	دشتستان	۱	۸۳	۱۶	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۲,۴۵۰
۶۶	فارس	شهید میثم علی قیارلو	دشتی	۲	۱۲۰	۱۸	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۶۷	فارس	شیخ طوسی	دشتی	۲	۱۲۰	۱۳	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۶۸	فارس	شهید صادقی شورباخورلو	دهرم دژگاه	۱	۸۳	۱۷	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۲,۴۵۰
۶۹	فارس	ابوذر	زرین دشت	۲	۱۲۰	۱۵	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۷۰	فارس	صفا دره شوری	زرین دشت	۱	۶۴	۱۲	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۷۱	فارس	امام علی النقی	فراشبند	۱	۶۴	۱۲	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۷۲	فارس	دوازده فروردین	فراشبند	۱	۶۴	۱۳	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۷۳	فارس	ش باهنر کله لو	فراشبند	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۷۴	فارس	ش بهشتی مولایی	فراشبند	۱	۶۴	۱۲	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۷۵	فارس	شهیدحسن تاویلی	فراشبند	۱	۶۴	۱۲	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۷۶	فارس	شهید گودرز سهامی	فسا	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۷۷	فارس	سیار محصل	فیروزآباد	۱	۶۴	۱۱	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۷۸	فارس	نبویه	فیروزآباد	۱	۸۳	۱۹	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۲,۴۵۰
۷۹	فارس	ش چمران غجه بیگلر	قیر	۴	۲۲۰	۱۳	شروع نشده	فاقد قرارداد	۳۳,۰۰۰
۸۰	فارس	شیخ انصاری اخچلو	قیروکارزین	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۸۱	فارس	ابوذر	کازرون	۲	۱۲۰	۴۱	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۸۲	فارس	دستغیب خیرات لو	کازرون	۱	۶۴	۱۲	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰

لیست نهایی تایید شده مدارس کانکسی مشمول طرح شهید پناهی سطح استان

ردیف	استان	نام پروژه	شهرستان محل اجرا	تعداد کلاس	زیربنا	تعداد دانش آموز	وضعیت پروژه (در دست اجرا / شروع نشده)	محل تامین اعتبار پروژه «برکت / سایر (با ذکر نام)»	ردیف
۸۳	فارس	ش علی یار هاشمی	کازرون	۴	۲۲۰	۴۵	شروع نشده	فاقد قرارداد	۳۳,۰۰۰
۸۴	فارس	ش مطهری قاسملو	کازرون	۴	۲۲۰	۲۴	شروع نشده	فاقد قرارداد	۳۳,۰۰۰
۸۵	فارس	شهدای خیبر	کازرون	۱	۶۴	۱۱	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۸۶	فارس	شهید علی حیدری توابع	کازرون	۴	۲۲۰	۵۵	شروع نشده	فاقد قرارداد	۳۳,۰۰۰
۸۷	فارس	شهید داراب پور	کازرون- تل سامان	۳	۱۵۴.۵	۳۵	شروع نشده	فاقد قرارداد	۲۳,۱۷۵
۸۸	فارس	شهید دستغیب قرمزی	کازرون - شهرک ملایوط	۴	۲۲۰	۷۸	شروع نشده	فاقد قرارداد	۳۳,۰۰۰
۸۹	فارس	آیت اله پسندیده	کوار	۱	۶۴	۱۲	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۹۰	فارس	ش چمران یادگوری	گجساران	۲	۱۲۰	۲۵	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۹۱	فارس	شهدای نبرد محرم	مبارک آباد باروس	۱	۶۴	۱۵	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۹۲	فارس	احد ارباب دار	مرودشت	۱	۶۴	۱۲	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۹۳	فارس	ش رجائی کورش	کازرون	۱	۶۴	۱۱	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۹۴	فارس	منتظر قائم	سروستان	۱	۸۳	۳۰	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۲,۴۵۰
۹۵	فارس	شهید باکری	میمند-مهکویه	۱	۶۴	۱۱	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۹۶	فارس	مهدی موعود	شرق	۳	۱۵۴.۵	۳۰	شروع نشده	فاقد قرارداد	۲۳,۱۷۵
۹۷	فارس	حسین مرادی	جهرم	۱	۸۳	۱۶	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۲,۴۵۰
۹۸	فارس	مدرسه ۱ کلاسه روستای فدایی	داراب	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰
۹۹	فارس	شهدای مکه	جهرم	۱	۶۴	۱۴	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۱۰۰	فارس	حاتم سلیمی	سروستان	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰
۱۰۱	فارس	مدرسه شمس	کازرون	۲	۱۲۰	۲۱	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۸,۰۰۰

طرح شهید پناهی

فاز دوم:

**مشخص کردن ضوابط فنی
مربوط به طرح**

لیست نهایی تایید شده مدارس کانکسی مشمول همراه با ضوابط فنی مربوط به طرح

ردیف	استان	نام پروژه	شهرستان محل اجرا	تعداد کلاس	زیربنا	تعداد دانش آموز	شماره نقشه
۱	فارس	تلاش - تیره کروش شش بلوکی	فراشبند	۲	۱۲۰	۳۱	2992
۲	فارس	شهیداندرزگو	داراب	۴	۲۲۰	۶۲	2051-a-r
۳	فارس	آیت اله نسابه	داراب - شهرک عطابخش	۵	۴۱۴	۹۵	2089-2-a
۴	فارس	آیت اله غفاری اتحاد هنگام	قیروکارزین	۶	۴۵۸	۹۰	2824-2
۵	فارس	مدرسه 2 کلاسه روستای چم کوکو	خنج	۲	۱۲۰	۲۰	2992
۶	فارس	مدرسه شهید قلی آقارضایی روستای شیر داهی	خنج	۲	۱۲۰	۲۷	2992
۷	فارس	انصار الحسین کلاه سیاه	خنج	۱	۸۳	۱۶	2931
۸	فارس	فردوسی	لار جویم	۱	۸۳	۱۸	2931
۹	فارس	مدرسه 3 کلاسه شهرک عشایری چاپهن	فسا	۳	۱۵۴.۵	۳۰	2778
۱۰	فارس	بنت الهدی	قیروکارزین	۱	۶۴	۱۵	2931
۱۱	فارس	مدرسه 3 کلاسه روستای چاه کردانی	استهبان	۳	۱۵۴.۵	۳۰	2778
۱۲	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای سیمکان	جهرم	۱	۶۴	۲۰	2931
۱۳	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای موسویه	جهرم	۱	۶۴	۲۰	2931
۱۴	فارس	مدرسه 2 کلاسه روستای کربال	خرامه	۲	۱۲۰	۲۰	2992
۱۵	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای سده	خنج	۱	۶۴	۲۰	2931
۱۶	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای سیف آباد	خنج	۱	۶۴	۲۰	2931
۱۷	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای بیزان	داراب	۱	۶۴	۲۰	2931
۱۸	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای دشت خاک	زرین دشت	۱	۶۴	۲۰	2931
۱۹	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای مومن آباد	سروستان	۱	۶۴	۲۰	2931
۲۰	فارس	مدرسه 2 کلاسه روستای بکک	شیراز	۲	۱۲۰	۲۰	2992

لیست نهایی تایید شده مدارس کانکسی مشمول همراه با ضوابط فنی مربوط به طرح

ردیف	استان	نام پروژه	شهرستان محل اجرا	تعداد کلاس	زیربنا	تعداد دانش آموز	شماره نقشه
۲۱	فارس	مدرسه 2 کلاسه روستای سیاخ نوروز آباد	شیراز	۲	۱۲۰	۲۰	2992
۲۲	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای کورکی 2	فرشبند	۱	۶۴	۲۰	2931
۲۳	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای گنبد	فرشبند	۱	۶۴	۲۰	2931
۲۴	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای آویز	فرشبند	۱	۶۴	۲۰	2931
۲۵	فارس	مدرسه 2 کلاسه روستای پهنپهن	فرشبند	۲	۱۲۰	۲۰	2992
۲۶	فارس	مدرسه 2 کلاسه روستای قرداش آباد	فرشبند	۲	۱۲۰	۲۰	2992
۲۷	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای مه بنیاد	فیروزآباد	۱	۶۴	۲۰	2931
۲۸	فارس	مدرسه 2 کلاسه روستای سلامت آباد	فیروزآباد	۲	۱۲۰	۲۰	2992
۲۹	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای ملافله	قیر	۱	۶۴	۲۰	2931
۳۰	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای نو آباد	قیر	۱	۶۴	۲۰	2931
۳۱	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای هنگام	قیر	۱	۶۴	۲۰	2931
۳۲	فارس	مدرسه 3 کلاسه روستای باغ نو	قیر	۳	۱۵۴.۵	۳۰	2778
۳۳	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای حسین آباد	کازرون	۱	۶۴	۲۰	2931
۳۴	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای حسین آباد دیلمی	کازرون	۱	۶۴	۲۰	2931
۳۵	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای دادین	کازرون	۱	۶۴	۲۰	2931
۳۶	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای شور عبدالعلیخانی	کازرون	۱	۶۴	۲۰	2931
۳۷	فارس	مدرسه 2 کلاسه روستای جره	کازرون	۲	۱۲۰	۲۰	2992
۳۸	فارس	مدرسه 2 کلاسه روستای سرمشهد	کازرون	۲	۱۲۰	۲۰	2992
۳۹	فارس	مدرسه 3 کلاسه روستای تل سامان	کازرون	۳	۱۵۴.۵	۳۰	2778
۴۰	فارس	مدرسه 3 کلاسه روستای سرمشهد	کازرون	۳	۱۵۴.۵	۳۰	2778
۴۱	فارس	مدرسه 3 کلاسه روستای علی آباد	کازرون	۳	۱۵۴.۵	۳۰	2778

لیست نهایی تایید شده مدارس کانکسی مشمول همراه با ضوابط فنی مربوط به طرح

ردیف	استان	نام پروژه	شهرستان محل اجرا	تعداد کلاس	زیربنا	تعداد دانش آموز	شماره نقشه
۴۲	فارس	مدرسه ۲ کلاسه روستای مسیح آباد	لارستان	۲	۱۲۰	۲۰	2992
۴۳	فارس	مدرسه ۲ کلاسه روستای منصور آباد	لارستان	۲	۱۲۰	۲۰	2992
۴۴	فارس	مدرسه ۳ کلاسه روستای چغدویه	لارستان	۳	۱۵۴.۵	۳۰	2778
۴۵	فارس	مدرسه ۲ کلاسه روستای کره ای	مرودشت	۲	۱۲۰	۲۰	2992
۴۶	فارس	مدرسه ۲ کلاسه شهرک عشایری ابن سینا	مرودشت	۲	۱۲۰	۲۰	2992
۴۷	فارس	پیوند سادات (بیخ و بنگل داراب)	داراب	۹	669	۲۱۶	2968-a
۴۸	فارس	خندق	ارسنجان	۲	۱۲۰	۲۴	2992
۴۹	فارس	رمضان	ارسنجان	۱	۶۴	۱۷	2931
۵۰	فارس	قوامین لبردانی	ارسنجان	۱	۶۴	۱۳	2931
۵۱	فارس	شهید جواد احمد آبادی	جهرم	۱	۶۴	۱۲	2931
۵۲	فارس	فرهنگ	جهرم	۱	۶۴	۱۵	2931
۵۳	فارس	میرزا کوچک خان	خنج	۱	۶۴	۱۴	2931
۵۴	فارس	امام حسن مجتبی	داراب	۶	563	۳۵۲	2622
۵۵	فارس	قاموس	داراب	۱	۶۴	۱۱	2931
۵۶	فارس	دهه فجر دوقزلو	دشتستان	۱	۶۴	۱۳	2931
۵۷	فارس	ذخایرانقلاب	دشتستان	۲	۱۲۰	۲۱	2992
۵۸	فارس	ش چمران توابع	دشتستان	۱	۸۳	۱۷	2931
۵۹	فارس	ش فلاحتی توابع	دشتستان	۲	۱۲۰	۲۶	2992
۶۰	فارس	شباهنک	دشتستان	۲	۱۲۰	۲۳	2992
۶۱	فارس	شهید شاهین نادری	دشتستان	۱	۶۴	۱۴	2931
۶۲	فارس	شهید علی قاندي	دشتستان	۲	۱۲۰	۱۹	2992
۶۳	فارس	شهید محمد باقر صدر	دشتستان	۲	۱۲۰	۲۱	2992
۶۴	فارس	شوریده شیرازی	دشتستان	۱	۶۴	۱۱	2931

لیست نهایی تایید شده مدارس کانکسی مشمول همراه با ضوابط فنی مربوط به طرح

ردیف	استان	نام پروژه	شهرستان محل اجرا	تعداد کلاس	زیربنا	تعداد دانش آموز	شماره نقشه
۶۵	فارس	مقداددوقزلو	دشتستان	۱	۸۳	۱۶	2931
۶۶	فارس	شهید میثم علی قیارلو	دشتی	۲	۱۲۰	۱۸	2992
۶۷	فارس	شیخ طوسی	دشتی	۲	۱۲۰	۱۳	2992
۶۸	فارس	شهید صادقی شورباخورلو	دهرم دژگاه	۱	۸۳	۱۷	2931
۶۹	فارس	ابوذر	زرین دشت	۲	۱۲۰	۱۵	2992
۷۰	فارس	صفا دره شوری	زرین دشت	۱	۶۴	۱۲	2931
۷۱	فارس	امام علی النقی	فراشبند	۱	۶۴	۱۲	2931
۷۲	فارس	دوازده فروردین	فراشبند	۱	۶۴	۱۳	2931
۷۳	فارس	ش باهنر کله لو	فراشبند	۲	۱۲۰	۲۰	2992
۷۴	فارس	ش بهشتی مولایی	فراشبند	۱	۶۴	۱۲	2931
۷۵	فارس	شهیدحسن تاویلی	فراشبند	۱	۶۴	۱۲	2931
۷۶	فارس	شهید گودرز سهامی	فسا	۲	۱۲۰	۲۰	2992
۷۷	فارس	سیار محصل	فیروزآباد	۱	۶۴	۱۱	2931
۷۸	فارس	نبویه	فیروزآباد	۱	۸۳	۱۹	2931
۷۹	فارس	ش چمران غجه بیگلو	قیر	۴	۲۲۰	۱۳	2051-a-r
۸۰	فارس	شیخ انصاری اخچلو	قبروکارزین	۱	۶۴	۲۰	2931
۸۱	فارس	ابوذر	کازرون	۲	۱۲۰	۴۱	2992
۸۲	فارس	دستغیب خیرات لو	کازرون	۱	۶۴	۱۲	2931
۸۳	فارس	ش علی یارهاشمی	کازرون	۴	۲۲۰	۴۵	2051-a-r
۸۴	فارس	ش مطهری قاسملو	کازرون	۴	۲۲۰	۲۴	2051-a-r

لیست نهایی تایید شده مدارس کانکسی مشمول همراه با ضوابط فنی مربوط به طرح

ردیف	استان	نام پروژه	شهرستان محل اجرا	تعداد کلاس	زیربنا	تعداد دانش آموز	شماره نقشه
۸۵	فارس	شهدای خیبر	کازرون	۱	۶۴	۱۱	2931
۸۶	فارس	شهید علی حیدری توابع	کازرون	۴	۲۲۰	۵۵	2051-a-r
۸۷	فارس	شهید داراب پور	کازرون- تل سامان	۳	۱۵۴.۵	۳۵	2778
۸۸	فارس	شهید دستغیب قرمزی	کازرون - شهرک مابلوط	۴	۲۲۰	۷۸	2051-a-r
۸۹	فارس	آیت اله پسندیده	کوار	۱	۶۴	۱۲	2931
۹۰	فارس	ش چمران یادگوری	گجساران	۲	۱۲۰	۲۵	2992
۹۱	فارس	شهدای نبرد محرم	مبارک آباد بارس	۱	۶۴	۱۵	2931
۹۲	فارس	احد ارباب دار	مرودشت	۱	۶۴	۱۲	2931
۹۳	فارس	ش رجائی کورش	کازرون	۱	۶۴	۱۱	2931
۹۴	فارس	منتظر قائم	سروستان	۱	۸۳	۳۰	2931
۹۵	فارس	شهید باکری	میمندهمکویه	۱	۶۴	۱۱	2931
۹۶	فارس	مهدی موعود	شرق	۳	۱۵۴.۵	۳۰	2778
۹۷	فارس	حسین مرادی	جهرم	۱	۸۳	۱۶	2931
۹۸	فارس	مدرسه 1 کلاسه روستای فدایی	داراب	۱	۶۴	۲۰	2931
۹۹	فارس	شهدای مکه	جهرم	۱	۶۴	۱۴	2931
۱۰۰	فارس	حاتم سلیمی	سروستان	۱	۶۴	۲۰	2931
۱۰۱	فارس	مدرسه شمس	کازرون	۲	۱۲۰	۲۱	2992

طرح شهید پناهی

فاز سوم:

**منابع مالی طرح صرفاً جهت
ساختمان آموزشی**

آمار مدارس قرارداد بسته شده به اضافه در مرحله انعقاد قرارداد

ردیف	نام پروژه	کد فضا	شهرستان محل اجرا	نوع کانکسی / سنگی	تعداد کلاس	زیربنا	تعداد دانش آموز	وضعیت پروژه (در دست اجرا / شروع نشده)	محل تأمین اعتبار پروژه «برکت / سایر (با ذکر نام)»	اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)	توضیحات
۱	پیوند سادات (بیخ و بنگل داراب)	۲۶۶۸۸۲۳۲	داراب	کانکسی	۹	۶۶۹	۲۱۶	در دست اجرا	در مرحله انعقاد قرارداد از محل ابلاغ جمع مدارس کانکسی	۱۰۰,۳۵۰	در مرحله انعقاد قرارداد
۲	مدرسه ۱ کلاسه روستای مومن آباد	۲۷۱۶۱۹۰۷	سروستان	کانکسی	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰	در مرحله انعقاد قرارداد
۳	مدرسه ۳ کلاسه روستای چاه کردانی	۱۸۳۰۳۱۱۰	استهبان	کانکسی	۳	۱۵۴.۵	۳۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۲۳,۱۷۵	در مرحله انعقاد قرارداد
۴	مدرسه ۳ کلاسه شهرک عشایری چاپهن	۲۷۰۳۱۱۱۷	فسا	کانکسی	۳	۱۵۴.۵	۳۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۲۳,۱۷۵	در مرحله انعقاد قرارداد
۵	مدرسه ۱ کلاسه روستای سده	۱۲۷۷۰۶۵۷	خنج	کانکسی	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰	در مرحله انعقاد قرارداد
۶	مدرسه ۱ کلاسه روستای سیف آباد	۱۸۲۶۱۳۷۳	خنج	کانکسی	۱	۶۴	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۶۰۰	در مرحله انعقاد قرارداد
۷	مدرسه ۲ کلاسه روستای چم کوکو	۱۸۳۱۶۵۲۰	خنج	کانکسی	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰	در مرحله انعقاد قرارداد
۸	مدرسه ۲ کلاسه روستای مسیح آباد	۱۸۲۸۶۳۱۱	لارستان	کانکسی	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰	در مرحله انعقاد قرارداد
۹	مدرسه ۲ کلاسه روستای منصور آباد	۱۸۳۵۲۶۶۲	لارستان	کانکسی	۲	۱۲۰	۲۰	شروع نشده	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰	در مرحله انعقاد قرارداد
۱۰	مدرسه ۲ کلاسه روستای قرداش آباد	۴۸۵۰۳۶۰۰	فرابند	کانکسی	۲	۱۲۰	۲۰	در دست اجرا	۴۰ درصد تحقق بنیاد برکت در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰	در مرحله اجرا

آمار پروژه های نیمه تمام با مشارکت بنیاد برکت

ردیف	نام پروژه	شهرستان محل اجرا	تعداد کلاس	زیربنا	تعداد دانش آموز	سال شروع	سال خاتمه	وضعیت پروژه (در دست اجرا / شروع نشده)	اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)
۱	مدرسه ۲ کلاسه روستای چم کوکو	خنج	۲	۱۲۰	۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۲	مدرسه ۳ کلاسه شهرک عشایری چاپهن	فسا	۳	۱۵۴.۵	۳۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	در مرحله انعقاد قرارداد	۲۷,۰۰۰
۳	مدرسه ۳ کلاسه روستای چاه کردانی	استهبان	۳	۱۵۴.۵	۳۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	در مرحله انعقاد قرارداد	۲۷,۰۰۰
۴	مدرسه ۱ کلاسه روستای سیمکان	جهرم	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۹,۰۰۰
۵	مدرسه ۱ کلاسه روستای موسویه	جهرم	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۹,۰۰۰
۶	مدرسه ۲ کلاسه روستای کربال	خرامه	۲	۱۲۰	۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۱۸,۰۰۰
۷	مدرسه ۱ کلاسه روستای سده	خنج	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۰۰۰
۸	مدرسه ۱ کلاسه روستای سیف آباد	خنج	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۰۰۰
۹	مدرسه ۱ کلاسه روستای بیزان	داراب	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۹,۰۰۰
۱۰	مدرسه ۱ کلاسه روستای دشت خاک	زرین دشت	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۹,۰۰۰
۱۱	مدرسه ۱ کلاسه روستای مومن آباد	سروستان	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	در مرحله انعقاد قرارداد	۹,۰۰۰
۱۲	مدرسه ۲ کلاسه روستای بکک	شیراز	۲	۱۲۰	۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۱۸,۰۰۰
۱۳	مدرسه ۲ کلاسه روستای سیاخ نوروز آباد	شیراز	۲	۱۲۰	۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۱۸,۰۰۰
۱۴	مدرسه ۱ کلاسه روستای کورکی ۲	فراشبند	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۹,۰۰۰
۱۵	مدرسه ۱ کلاسه روستای گنبد	فراشبند	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۹,۰۰۰
۱۶	مدرسه ۱ کلاسه روستای آویز	فراشبند	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۹,۰۰۰
۱۷	مدرسه ۲ کلاسه روستای پهنایپهن	فراشبند	۲	۱۲۰	۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۱۸,۰۰۰
۱۸	مدرسه ۲ کلاسه روستای قرداش آباد	فراشبند	۲	۱۲۰	۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	در حال اجرا	۱۸,۰۰۰
۱۹	مدرسه ۱ کلاسه روستای مه بنیاد	فیروزآباد	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۹,۰۰۰
۲۰	مدرسه ۲ کلاسه روستای سلامت آباد	فیروزآباد	۲	۱۲۰	۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۱۸,۰۰۰

آمار پروژه های نیمه تمام با مشارکت بنیاد برکت

۲۱	مدرسه ۱ کلاسه روستای ملافله	قیر	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۹,۰۰۰
۲۲	مدرسه ۱ کلاسه روستای نو آباد	قیر	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۹,۰۰۰
۲۳	مدرسه ۱ کلاسه روستای هنگام	قیر	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۹,۰۰۰
۲۴	مدرسه ۳ کلاسه روستای باغ نو	قیر	۳	۱۵۴.۵	۳۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۲۷,۰۰۰
۲۵	مدرسه ۱ کلاسه روستای حسین آباد	کازرون	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۹,۰۰۰
۲۶	مدرسه ۱ کلاسه روستای حسین آباد دیلمی	کازرون	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۹,۰۰۰
۲۷	مدرسه ۱ کلاسه روستای دادین	کازرون	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۹,۰۰۰
۲۸	مدرسه ۱ کلاسه روستای شور عبدل علیخانی	کازرون	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۹,۰۰۰
۲۹	مدرسه ۲ کلاسه روستای جره	کازرون	۲	۱۲۰	۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۱۸,۰۰۰
۳۰	مدرسه ۲ کلاسه روستای سرمشهد	کازرون	۲	۱۲۰	۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۱۸,۰۰۰
۳۱	مدرسه ۳ کلاسه روستای تل سامان	کازرون	۳	۱۵۴.۵	۳۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۲۷,۰۰۰
۳۲	مدرسه ۳ کلاسه روستای سرمشهد	کازرون	۳	۱۵۴.۵	۳۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۲۷,۰۰۰
۳۳	مدرسه ۳ کلاسه روستای علی آباد	کازرون	۳	۱۵۴.۵	۳۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۲۷,۰۰۰
۳۴	مدرسه ۲ کلاسه روستای مسیح آباد	لارستان	۲	۱۲۰	۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۳۵	مدرسه ۲ کلاسه روستای منصور آباد	لارستان	۲	۱۲۰	۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	در مرحله انعقاد قرارداد	۱۸,۰۰۰
۳۶	مدرسه ۳ کلاسه روستای چغدویه	لارستان	۳	۱۵۴.۵	۳۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۲۷,۰۰۰
۳۷	مدرسه ۲ کلاسه روستای کره ای	مرودشت	۲	۱۲۰	۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۱۸,۰۰۰
۳۸	مدرسه ۲ کلاسه شهرک عشایری ابن سینا	مرودشت	۲	۱۲۰	۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۱۸,۰۰۰
۳۹	مدرسه ۱ کلاسه روستای فدामी	داراب	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۹,۰۰۰
۴۰	شهید اندرزگو	داراب	۴	۲۲۰	۶۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۳۶,۰۰۰
۴۱	مدرسه ۲ کلاسه روستای افزر	قیر	۲	۱۲۰	۲۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	۱۸,۰۰۰

آمار مدارس دارای خیر

ردیف	نام پروژه	کد فضا	شهرستان محل اجرا	تعداد کلاس	تعداد زیر بنا	تعداد دانش آموز	سال شروع	سال خاتمه	وضعیت پروژه (در دست اجرا / شروع نشده)	محل تأمین اعتبار پروژه «برکت / سایر (با ذکر نام)»	اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)	مبلغ هزینه شده توسط خیر	میزان تعهد خیر	توضیحات
۱	تلاش - تیره کروش شش بلوکی	۱۸۳۴۰۰ ۷	فراشبند	۲	۱۲۰	۳۱	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	فاقد قرارداد	۱۸,۰۰۰	۴,۰۰۰		تا سقف زده شده
۲	ش بهشتی - شورباخورلو	۲۷۱۶۰۹ ۹۳	فراشبند	۱	۶۴	۱۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	شروع نشده	فاقد قرارداد	۹,۶۰۰	۵,۰۰۰		تا سقف زده شده

آمار مدارس از اعتبارات سازمان نوسازی

ردیف	نام پروژه	کد فضا	شهرستان محل اجرا	تعداد کلاس	زیر بنا	تعداد دانش آموز	سال شروع	سال خاتمه	وضعیت پروژه (در دست اجرا / شروع نشده)	محل تأمین اعتبار پروژه «برکت / سایر (با ذکر نام)»	اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)	مبلغ هزینه شده توسط خیر	میزان تعهد خیر	توضیحات
۱	پیوند سادات (بیخ و بنگل داراب)	۲۶۶۸۸۲ ۳۲	داراب	۹	۶۶۹	۲۱۶	۱۴۰۱	۱۴۰۲	در دست اجرا	در مرحله انعقاد قرارداد از محل ابلاغ جمع مدارس کانکسی	۱۰۰,۳۵۰	۴,۰۰۰		اعتبارات نوسازی

طرح شهید پناهی

فاز چهارم:

اجرا و نظارت و عملیات اجرایی

نام
مدرسه

پیوند
سادات

شهرستان

داراب

تعداد
کانکس

۹

تعداد دانش
آموز

۲۱۶



طرح شهید پناهی

فاز پنجم:

**اطلاع رسانی و پیوست رسانه
ای طرح**

تعداد دانش
آموز

۶۲

+

تعداد
کانکس

۴

+

شهرستان

داراب

=

نام
مدرسه

شهید
اندرزگو



تعداد دانش
آموز

۳۰

+

تعداد
کانکس

۳

+

شهرستان

لارستان

=

نام
مدرسه

حضرت
امیر
چغدویه



تعداد دانش
آموز

۱۱

+

تعداد
کانکس

۱

+

شهرستان

داراب

=

نام
مدرسه

قاموس



تعداد دانش
آموز

۹۵

+

تعداد
کانکس

۵

+

شهرستان

داراب

=

نام
مدرسه

آیت اله
نسابه

